

Register priestorových informácií

Význam národného projektu OPIS

Martin Koška



Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

Konzorcium dodávateľov:



SEVITECH

Agenda

- Cieľ projektu RPI
- Legislatívne zmeny
- Predmet projektu RPI
- Harmonogram projektu
- Aktivity s dopadom na povinné osoby

Ciele projektu RPI

- Vytvorenie RPI ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja údajov o všetkých priestorových informáciách, ktoré budú použiteľné pre potreby štátnych orgánov, orgánov samosprávy, fyzické a právnické osoby a jeho uvedenie do prevádzky
- Špecifické ciele – povinné osoby:
 - vybudovať integračné rozhrania pre existujúce **zdrojové registre poskytovateľov** priestorových údajov
 - implementovať služby RPI pre **sprístupnenie údajov** prostredníctvom RPI
- Špecifické ciele – eGovernment:
 - vytvoriť integračné rozhranie pre **pripojenie RPI na ostatné ISVS**
 - implementovať **eGovernment služby ako aj služby IS**
- **Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu informatizácia spoločnosti**

Legislatívne zmeny

- Novela zákona 3/2010 Z.z o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
 - Zakotvenie pojmu RPI v zákone
 - Povinnosti povinných osôb pre napĺňanie RPI
 - Vzťah národný geoportál a RPI
 - SK metaúdajový profil
 - Národná vyhľadávacia služba
 - RPI bude zabezpečovať zoznam povinných osôb

Legislatívne zmeny

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

- (8) Ministerstvo zabezpečuje, aby povinné osoby boli technicky schopné prepojiť svoje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov so sieťovými službami podľa § 6 ods. 1. Táto služba sa na požiadanie sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov sú v súlade s osobitnými predpismi a so všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovujúcimi povinnosti, najmä čo sa týka metaúdajov, sieťových služieb a interoperability.

Predmet projektu RPI – výstupy OPIS

- Vytvorenie 9 eGov služieb
 - Registrácia povinnej osoby
 - Registrácia súboru priestorových údajov
 - Registrácia služby priestorových údajov
 - Služby metaúdajov
 - Vyhľadávacie služby
 - Zobrazovacie služby
 - Ukladacie služby
 - Transformačné služby súborov priestorových údajov
 - Služby monitoringu a reportingu

22 služieb IS
evidované v MetaIS

Harmonogram projektu – termíny pri príprave projektu

- Zmluva o poskytnutí NFP

obdobie (mesiac.rok)	5.14	6.14	7.14	8.14	9.14	10.14	11.14	12.14	1.15	2.15	3.15	4.15	5.15	6.15	7.15	8.15	9.15	10.15	11.15	
Hlavné aktivity																				
Analýza a dizajn IS																				
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií																				
Implementácia IS																				
Testovanie IS																				
Nasadenie IS																				
Podporné aktivity																				
Riadenie projektu																				
Publicita a informovanosť																				

- Reálny posun zahájenia realizácie hlavných aktivít o 9 mesiacov

Harmonogram projektu – aktuálny stav

- Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

obdobie (mesiac.rok)	5.14	6.14	7.14	8.14	9.14	10.14	11.14	12.14	1.15	2.15	3.15	4.15	5.15	6.15	7.15	8.15	9.15	10.15	11.15	12.15					
Hlavné aktivity																									
Analýza a dizajn IS																									
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií																									
Implementácia IS																									
Testovanie IS																									
Nasadenie IS																									
Podporné aktivity																									
Riadenie projektu																									
Publicita a informovanosť																									
<table border="1"> <tr> <td>Skrátenie aktivít projektu</td> </tr> <tr> <td>Pôvodne plánovaná doba realizácie aktivít ZoD</td> </tr> <tr> <td>Navrhované predĺženie aktivít projektu</td> </tr> <tr> <td>Realizované vlastnými kapacitami MŽP</td> </tr> </table>																						Skrátenie aktivít projektu	Pôvodne plánovaná doba realizácie aktivít ZoD	Navrhované predĺženie aktivít projektu	Realizované vlastnými kapacitami MŽP
Skrátenie aktivít projektu																									
Pôvodne plánovaná doba realizácie aktivít ZoD																									
Navrhované predĺženie aktivít projektu																									
Realizované vlastnými kapacitami MŽP																									

- Dopad na ukončenie/rozdelenie projektu – fázovanie


- Fáza 1 - OPIS (Analýza a dizajn IS, Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií)
- Fáza 2 – OPII (Implementácia IS, Testovanie IS, Nasadenie IS)

Návrh harmonogramu projektu – Fázovanie

- Pilotná prevádzka 25/3/16 – 14/4/16
- Roll-out 15/4/16 – 2/5/16

Fáza1 - OPIS

Fáza2 - OPII

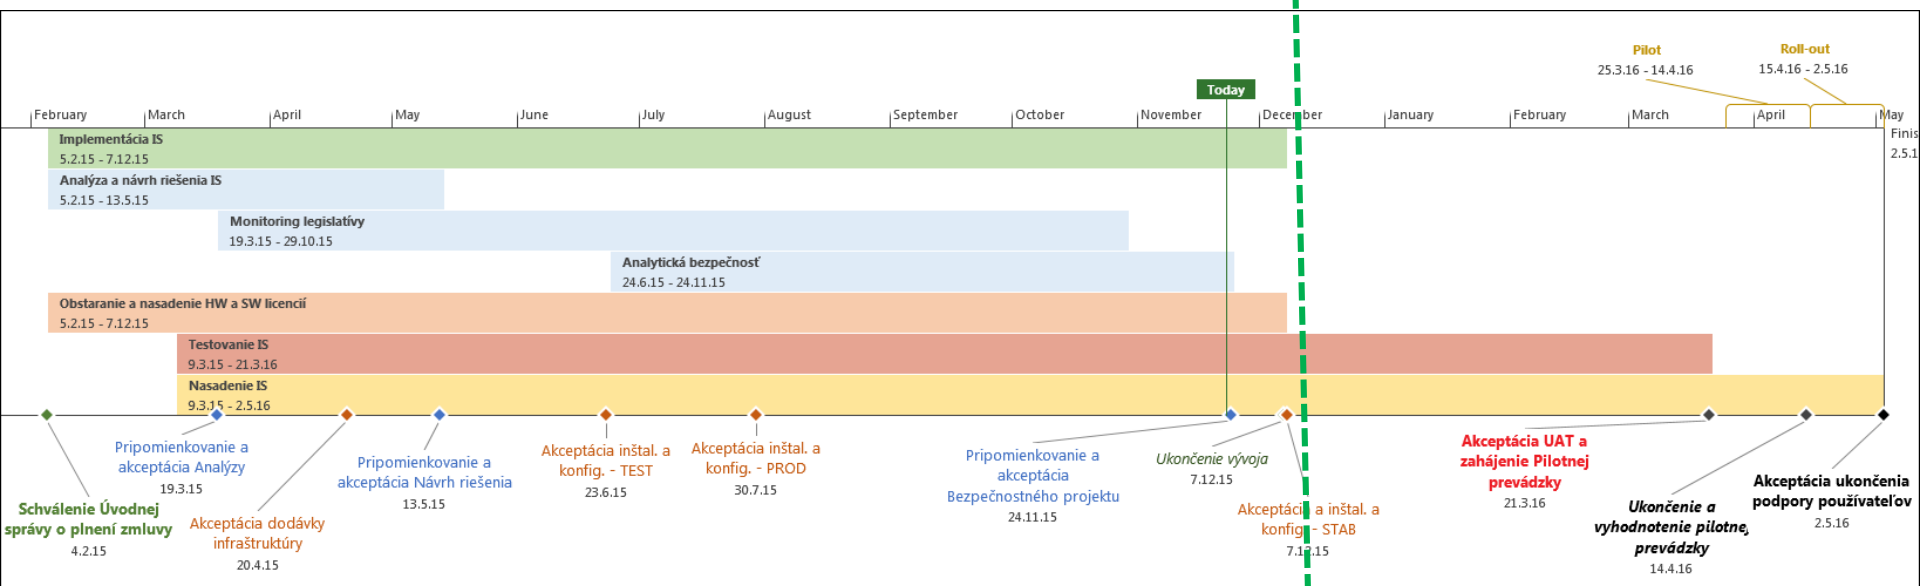

Aktivity s dopadom na povinné osoby

- Pilotná prevádzka (25/3/16 - 14/4/16)
 - Potvrdiť funkčnosť procesov s vybranou skupinou povinných osôb
 - Validovať používateľskú dokumentáciu v praxi
 - Potvrdiť integrácie na iné ISVS
- Skupinové školenia povinných osôb (5/4/16 - 26/4/15)
 - Registrácia povinnej osoby
 - Registrácia súboru priestorových údajov
 - Registrácia služby priestorových údajov
- Podpora používateľov (19/4/16 - 2/5/16)
 - Telefonická a mailová podpora pre povinné osoby

Záverom

- Plošná komunikácia s povinnými osobami
- Aktualizovaný zoznam povinných osôb
- Vytvorenie systému pridelovania identifikátorov pre priestorové údaje
- SK Metaúdajový profil
- Národná vyhľadávacia služba
- Automatizované generovanie monitorovacej správy pre EK
- Klient RPI bude obsahovať postupne napíňaný zoznam SLD štýlov pre zobrazovacie služby
- Mobilný klient



OPERAČNÝ PROGRAM
INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

Ďakujem za pozornosť

Projekt:

Register priestorových informácií
(ITMS 21110120051)



SEVITECH
